



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 7,8 Telepon (0536) 3232729 Fax. 3232729
PALANGKA RAYA 73112

LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN :


**PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI PRB
PROV. KALTENG**

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN :

2017



CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Seth Adji No. 62 Tlp Hp. 0811-5211117 Palangka Raya



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, bermaksud untuk memadukan unsur pemerintah, non pemerintah dan lembaga usaha untuk meningkatkan kapasitas dan peranan masing-masing dalam rangka mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakatnya dari bencana yang terjadi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Unsur Pemerintah Daerah dalam hal ini BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah melakukan salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat menghadapi bencana tersebut, termasuk dengan dipercayakannya CV. CAKRAWALA KATULISTIWA untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai Penyedia Barang dan Jasa.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut CV. CAKRAWALA KATULISTIWA menyesuaikan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang sudah ditentukan baik rencana mutu, biaya, volume, dan waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), dengan Nomor : SPK.428/BPB-PK/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017, waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, yang berakhir pada tanggal 06 September tahun 2017, yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pekerjaan Penyediaan Barang pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Pengurangan Risiko Bencana ini, adalah untuk :

1. Membantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah di dalam Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan.

2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang telah ditetapkan Oleh Pihak Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tujuannya adalah dapat menyediakan barang dan jasa pelaksanaan kegiatan dilapangan, sehingga hasil pekerjaan dapat terlaksana sesuai persyaratan spesifikasi dan tepat biaya dan waktu.

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan ini adalah :

1. Pekerjaan Pengadaan Papan Informasi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pekerjaan Pemasangan Papan Informasi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membuat Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;



Pelaksanaan Kegiatan

DATA UMUM PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : CV. CAKRAWALA KATULISTIWA
Nama Direktur : Andrei Pradata, S.Hut
Alamat : Jl. Seth Adji No. 62 Palangka Raya
NPWP : 02.437.590.9-711.000

Akte Pendirian

- a. Nomor Akta : Akta notaris No. 01
- b. Tanggal : 22 Nopember 2004
- c. Nama Notaris : TRISIA NOVA, SH

Akte Perubahan

- a. Nomor Akta : Akta Notaris No. 02
- b. Tanggal : 20 Februari 2015
- c. Nama Notaris : TRISIA NOVA, SH

DATA KEGIATAN

Unit Satuan : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah

Program : Pencegahan Bencana

Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov.
Kalteng

Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov.
Kalteng

Lokasi : Kota Palangka Raya

Pelaksana/Kontraktor : CV. CAKRAWALA KATULISTIWA Pusat Palangka Raya

Nomor Kontrak : SPK.428/BPB-PK/VIII/2017, Tanggal 08 Agustus 2017

Nilai Kontrak : RP. 44.230.000,-
(Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu
Rupiah)

Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Uraian Pekerjaan	Target Fisik		WAKTU PELAKSANAAN			
		Biaya (Rp.)	Bobot (%)	MINGGU KE 1 (%)	MINGGU KE 2 (%)	MINGGU KE 3 (%)	MINGGU KE 4 (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
	Pek. Pembersihan Lokasi	1,584,000	3.5812	100			
	Pek. Menggali tanah	2,171,689	4.9099	100			
B	PEKERJAAN BETON						
	Pek. Bekisting	1,721,781	3.8927		50	50	
	Pek. Beton	1,906,734	4.3109		50	50	
C	PEKERJAAN RANGKA						
	Membuat Tiang, Pipa Galvanis Ø2,5", tebal 2 mm	19,084,144	43.1467			100	
	Membuat Rangka	4,739,675	10.7158			100	
	Pemasangan Plat Aluminium, t = 2 mm	5,004,846	11.3153			100	
	Pemasangan Plat Strip Ukuran 4 x 3 mm	34,260	0.0775			100	
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
	Pengecatan Tiang dan Rangka dengan Cat Besi	1,548,685	3.5014				100
E	PEKERJAAN LAINNYA						
	Stiker ukuran 1,4 m x 1,0 m	1,980,000	4.4765		100		
	Pemasangan Stiker	1,782,000	4.0289			100	
	Mobilisasi	2,673,000	6.0433				100
Jumlah		44,230,815	100.00				

Dibuat Oleh :
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA
Palangka Raya



ANDREI PRADATA, S.Hut
Direktur



Dokumentasi Kegiatan

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Pendahuluan :

- Pekerjaan Pembersihan Lokasi

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



**Pekerjaan
Pendahuluan :**

- Pekerjaan Menggali Tanah

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



**Pekerjaan
Pendahuluan :**

- Pekerjaan Menggali Tanah

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Beton :

- Pekerjaan Pondasi

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Beton :

- Pekerjaan Pondasi

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Beton :

- Pekerjaan Pondasi

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Beton :


- Pekerjaan Pondasi

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan

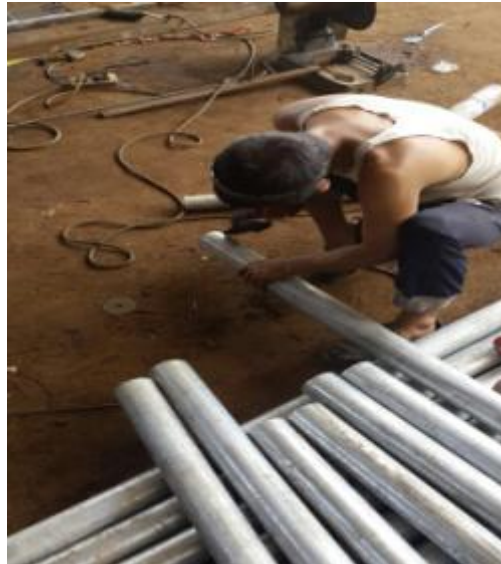

Pekerjaan Rangka :

- Membuat Tiang,
Pipa Galvanis Ø
2,5", Tebal 2 mm

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Rangka :

- Membuat Rangka

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Rangka :


- Pemasangan Plat Alumunium t = 2mm

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan

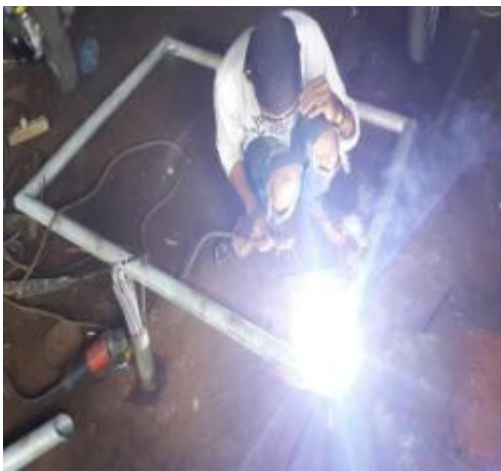

Pekerjaan Rangka :

- Pemasangan Plat Strip Uk. 4 x 3 mm



VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



**Pekerjaan
Pengecatan :**

- Pengecatan Tiang dan Rangka dengan Cat Besi

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pekerjaan Lainnya :

- Pemasangan Stiker



Pekerjaan Lainnya :

- Mobilisasi



VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN **CV. CAKRAWALA KATULISTIWA**

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Adonis Samad (Bandara)
- Koordinat $X = 113^{\circ}57'260''$, $Y = 02^{\circ}14'631''$



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Kereng Bangkiran (Sabaru)
- Koordinat $X = 113^{\circ}54'984''$, $Y = 02^{\circ}17'569''$

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN **CV. CAKRAWALA KATULISTIWA**

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Trans Kalimantan (Arah Kab. Pulang Pisau Kel. Kelampangan)
- Koordinat $X = 113^{\circ}58'607''$, $Y = 02^{\circ}16'540''$



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Trans Kalimantan (Perbatasan Kab. Pulang Pisau)
- Koordinat $X = 114^{\circ}02'815''$, $Y = 02^{\circ}18'037''$

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN **CV. CAKRAWALA KATULISTIWA**

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Mahir Mahar (Simpang Jln. G. Obos)
- Koordinat $X = 113^{\circ}52'056''$, $Y = 02^{\circ}14'557''$



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Yos Sudarso (Ujung)
- Koordinat $X = 113^{\circ}52'193''$, $Y = 02^{\circ}13'701''$

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN **CV. CAKRAWALA KATULISTIWA**

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Mahir Mahar (Simpang Jln. Hiu Putih)
- Koordinat X = 113°50'864", Y = 02°11'678"



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Mahir Mahar (Simpang Jln. Merdeka)
- Koordinat X = 113°50'507", Y = 02°09'720"

VISUAL/DOKUMENTASI PEKERJAAN
CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

Program	: Pencegahan Bencana
Kegiatan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Nomor Kontrak	: SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
Nilai Kontrak	: Rp. 44.230.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Kontraktor	: CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

VISUAL/DOKUMENTASI

Keterangan



Pemasangan Papan Informasi PRB :

- Lokasi Jln. Tjilik Riwut Km. 23
- Koordinat X = 113°46'360", Y = 02°04'748"

PETA LOKASI PEMASANGAN PAPAN INFORMASI PRB PROV. KALTENG

PETA SEBARAN PAPAN INFORMASI PRB PROV. KALTENG TAHUN 2017



U

SKALA

1:0

Legenda

- Titik Koordinat Papan Informasi
- Jalan Palangka Raya

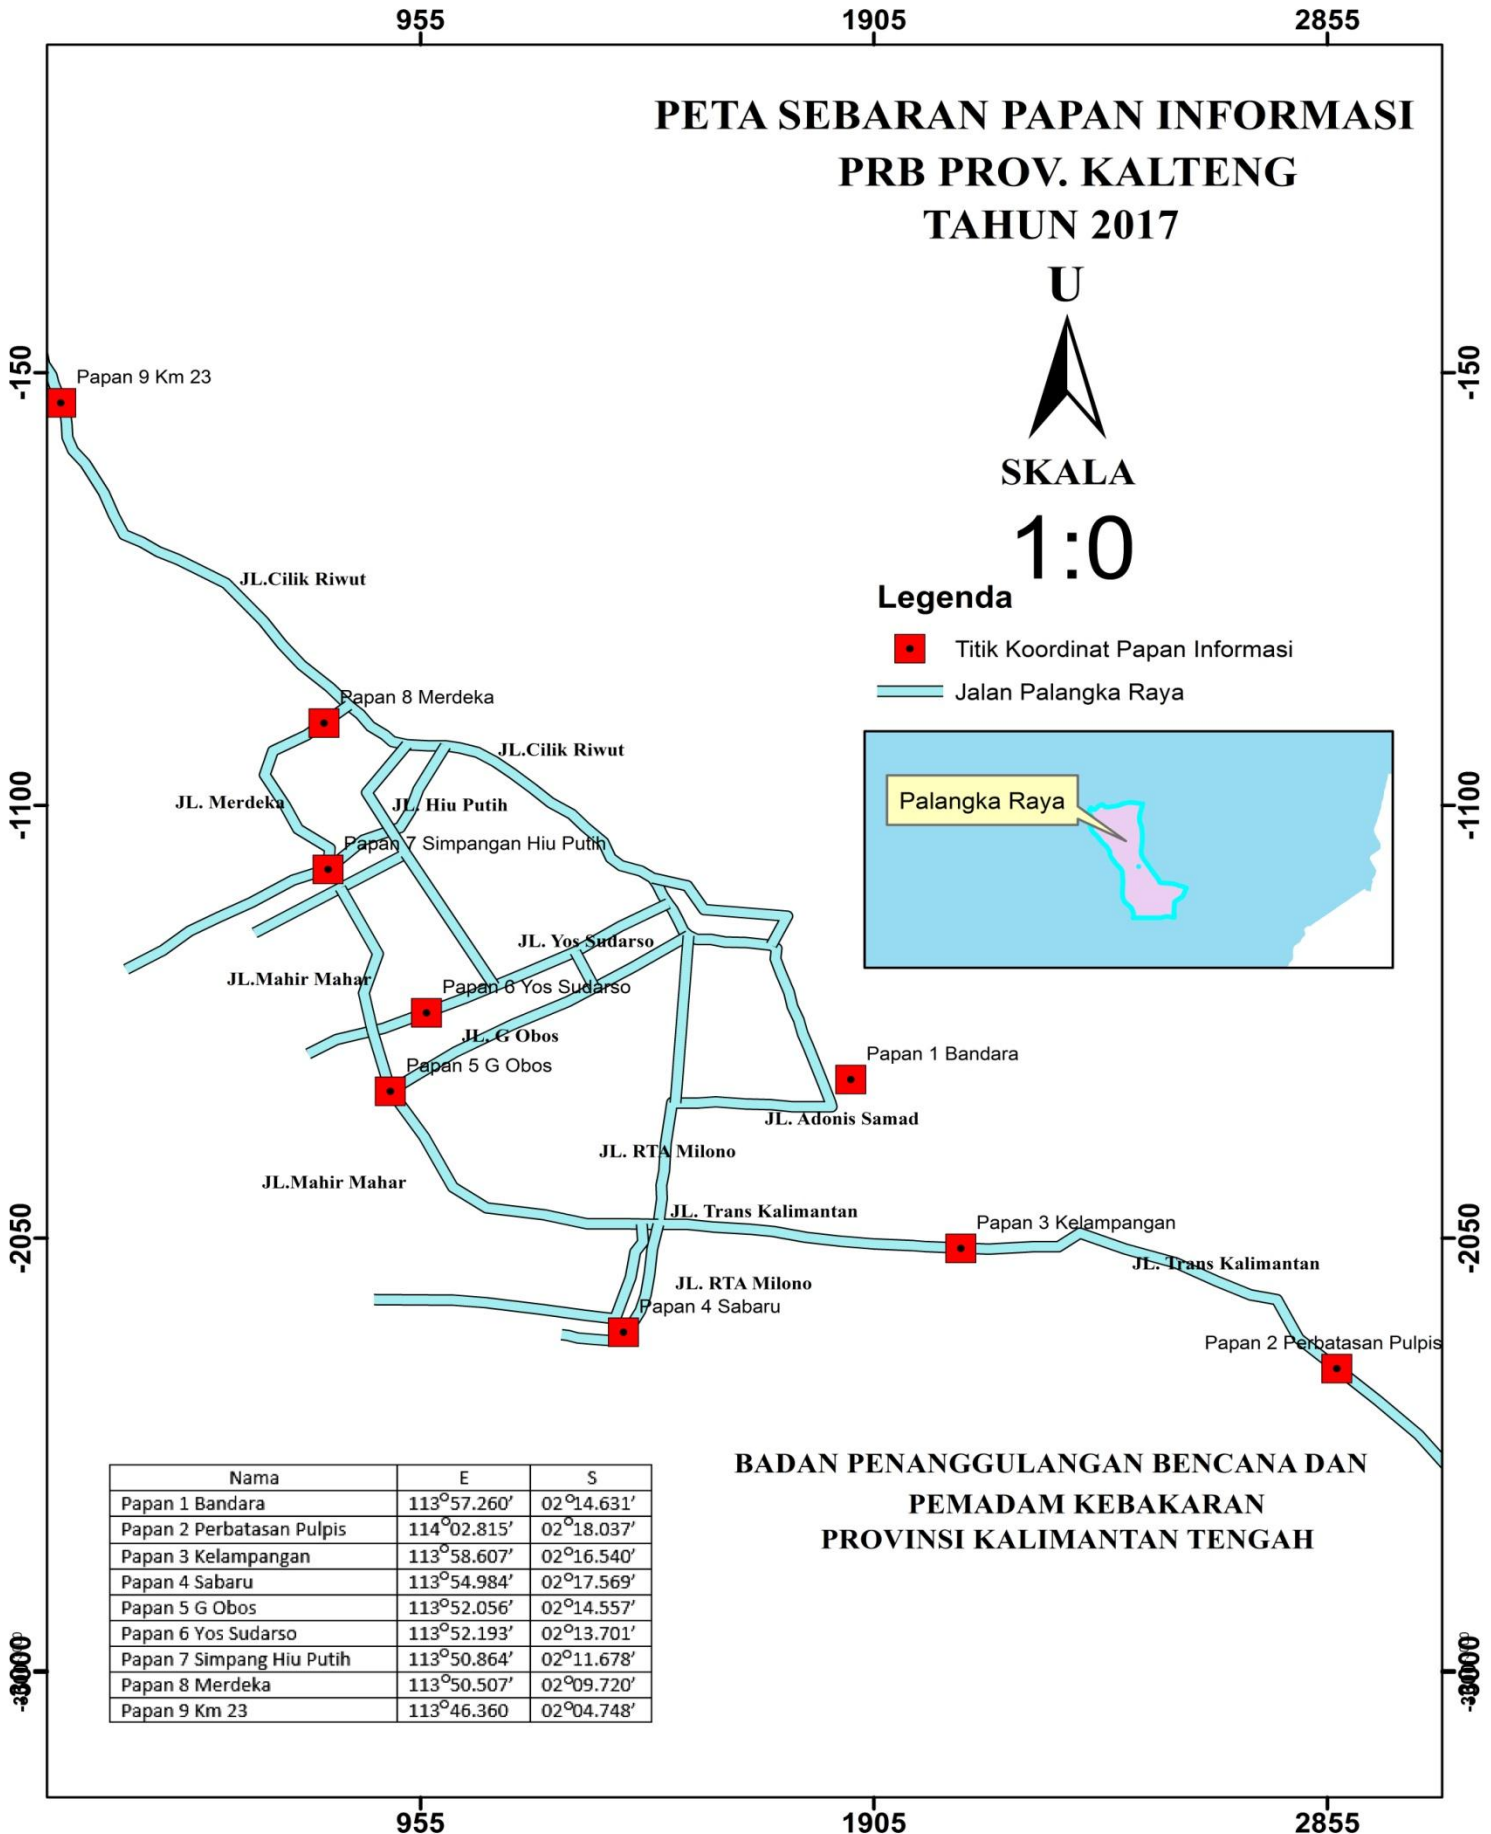

Nama	E	S
Papan 1 Bandara	113°57.260'	02°14.631'
Papan 2 Perbatasan Pulpis	114°02.815'	02°18.037'
Papan 3 Kelampangan	113°58.607'	02°16.540'
Papan 4 Sabaru	113°54.984'	02°17.569'
Papan 5 G Obos	113°52.056'	02°14.557'
Papan 6 Yos Sudarso	113°52.193'	02°13.701'
Papan 7 Simpang Hiu Putih	113°50.864'	02°11.678'
Papan 8 Merdeka	113°50.507'	02°09.720'
Papan 9 Km 23	113°46.360'	02°04.748'

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Program : Pencegahan Bencana
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
 Lokasi : Kota Palangka Raya
 Nomor Kontrak : SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
 Nilai Kontrak : Rp. 44.230.000,-
 Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
 Kontraktor : CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

No.	Uraian Pekerjaan	Target Fisik		WAKTU PELAKSANAAN						
		Biaya (Rp.)	Bobot (%)	Minggu Ke 1						
				H-1 (%)	H-2 (%)	H-3 (%)	H-4 (%)	H-5 (%)	H-6 (%)	H-7 (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN									
	Pek. Pembersihan Lokasi	1,584,000	3.5812	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	Pek. Menggali tanah	2,171,689	4.9099	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
B	PEKERJAAN BETON									
	Pek. Bekisting	1,721,781	3.8927	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Beton	1,906,734	4.3109	-	-	-	-	-	-	-
C	PEKERJAAN RANGKA									
	Membuat Tiang, Pipa Galvanis Ø2,5", tebal 2 mm	19,084,144	43.1467	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08
	Membuat Rangka	4,739,675	10.7158	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Plat Alumunium, t = 2 mm	5,004,846	11.3153	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Plat Strip Ukuran 4 x 3 mm	34,260	0.0775	-	-	-	-	-	-	-
D	PEKERJAAN PENGECATAN									
	Pengecatan Tiang dan Rangka dengan Cat Besi	1,548,685	3.5014	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN LAINNYA									
	Stiker ukuran 1,4 m x 1,0 m	1,980,000	4.4765	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Stiker	1,782,000	4.0289	-	-	-	-	-	-	-
	Mobilisasi	2,673,000	6.0433	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		44,230,815	100.00	4.29	8.59	12.88	17.18	21.47	25.77	30.06

Palangka Raya, 08 Agustus 2017

Dibuat Oleh :
 CV. CAKRAWALA KATULISTIWA
 Palangka Raya


ANDREI PRADATA, S.Hut
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Program : Pencegahan Bencana
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
 Lokasi : Kota Palangka Raya
 Nomor Kontrak : SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
 Nilai Kontrak : Rp. 44.230.000,-
 Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
 Kontraktor : CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

No.	Uraian Pekerjaan	Target Fisik			WAKTU PELAKSANAAN						
		Biaya (Rp.)	Bobot (%)	S/D MG 1	Minggu Ke 2						
					H-8 (%)	H-9 (%)	H-10 (%)	H-11 (%)	H-12 (%)	H-13 (%)	H-14 (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
	Pek. Pembersihan Lokasi	1,584,000	3.5812	3.5812	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Menggali tanah	2,171,689	4.9099	4.9099	-	-	-	-	-	-	-
B	PEKERJAAN BETON										
	Pek. Bekisting	1,721,781	3.8927	-	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
	Pek. Beton	1,906,734	4.3109	-	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
C	PEKERJAAN RANGKA										
	Membuat Tiang, Pipa Galvanis Ø2,5", tebal 2 mm	19,084,144	43.1467	21.5734	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08
	Membuat Rangka	4,739,675	10.7158	-	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Pemasangan Plat Aluminium, t = 2 mm	5,004,846	11.3153	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Plat Strip Ukuran 4 x 3 mm	34,260	0.0775	-	-	-	-	-	-	-	-
D	PEKERJAAN PENGECATAN										
	Pengecatan Tiang dan Rangka dengan Cat Besi	1,548,685	3.5014	-	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN LAINNYA										
	Stiker ukuran 1,4 m x 1,0 m	1,980,000	4.4765	-	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	Pemasangan Stiker	1,782,000	4.0289	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mobilisasi	2,673,000	6.0433	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		44,230,815	100.00	30.0645	35.90	41.74	47.58	53.42	59.26	65.09	70.93

Palangka Raya, 21 Agustus 2017

Dibuat Oleh :
 CV. CAKRAWALA KATULISTIWA
 Palangka Raya


ANDREI PRADATA, S.Hut
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Program : Pencegahan Bencana
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
 Lokasi : Kota Palangka Raya
 Nomor Kontrak : SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
 Nilai Kontrak : Rp. 44.230.000,-
 Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
 Kontraktor : CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

No.	Uraian Pekerjaan	Target Fisik			WAKTU PELAKSANAAN						
		Biaya (Rp.)	Bobot (%)	S/D MG 2	Minggu Ke 3						
					H-15 (%)	H-16 (%)	H-17 (%)	H-18 (%)	H-19 (%)	H-20 (%)	H-21 (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
	Pek. Pembersihan Lokasi	1,584,000	3.5812	3.5812	-	-	-	-	-	-	-
	Pek. Menggali tanah	2,171,689	4.9099	4.9099	-	-	-	-	-	-	-
B	PEKERJAAN BETON										
	Pek. Bekisting	1,721,781	3.8927	1.9464	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
	Pek. Beton	1,906,734	4.3109	2.1554	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
C	PEKERJAAN RANGKA										
	Membuat Tiang, Pipa Galvanis Ø2,5", tebal 2 mm	19,084,144	43.1467	43.1467	-	-	-	-	-	-	-
	Membuat Rangka	4,739,675	10.7158	10.7158	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Plat Alumunium, t = 2 mm	5,004,846	11.3153	-	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
	Pemasangan Plat Strip Ukuran 4 x 3 mm	34,260	0.0775	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
D	PEKERJAAN PENGECATAN										
	Pengecatan Tiang dan Rangka dengan Cat Besi	1,548,685	3.5014	-	-	-	-	-	-	-	-
E	PEKERJAAN LAINNYA										
	Stiker ukuran 1,4 m x 1,0 m	1,980,000	4.4765	4.4765	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Stiker	1,782,000	4.0289	-	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
	Mobilisasi	2,673,000	6.0433	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		44,230,815	100.00	70.9319	73.72	76.51	79.30	82.09	84.88	87.67	90.46

Palangka Raya, 28 Agustus 2017

Dibuat Oleh :
 CV. CAKRAWALA KATULISTIWA
 Palangka Raya


ANDREI PRADATA, S.Hut
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Program : Pencegahan Bencana
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng
 Lokasi : Kota Palangka Raya
 Nomor Kontrak : SPK.428/BPB-PK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017
 Nilai Kontrak : Rp. 44.230.000,-
 Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
 Kontraktor : CV. CAKRAWALA KATULISTIWA

No.	Uraian Pekerjaan	Target Fisik			WAKTU PELAKSANAAN									
		Biaya (Rp.)	Bobot (%)	S/D MG 3	Minggu Ke 4									
					H-22 (%)	H-23 (%)	H-24 (%)	H-25 (%)	H-26 (%)	H-27 (%)	H-28 (%)	H-29 (%)	H-30 (%)	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
	Pek. Pembersihan Lokasi	1,584,000	3.5812	3.5812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pek. Menggali tanah	2,171,689	4.9099	4.9099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	PEKERJAAN BETON													
	Pek. Bekisting	1,721,781	3.8927	3.8927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pek. Beton	1,906,734	4.3109	4.3109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	PEKERJAAN RANGKA													
	Membuat Tiang, Pipa Galvanis Ø2,5", tebal 2 mm	19,084,144	43.1467	43.1467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Membuat Rangka	4,739,675	10.7158	10.7158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Plat Alumunium, t = 2 mm	5,004,846	11.3153	11.3153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Plat Strip Ukuran 4 x 3 mm	34,260	0.0775	0.0775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	PEKERJAAN PENGECATAN													
	Pengecatan Tiang dan Rangka dengan Cat Besi	1,548,685	3.5014	3.5014	0.88	0.88	0.88	0.88	-	-	-	-	-	
E	PEKERJAAN LAINNYA													
	Stiker ukuran 1,4 m x 1,0 m	1,980,000	4.4765	4.4765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemasangan Stiker	1,782,000	4.0289	4.0289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mobilisasi	2,673,000	6.0433	-	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	-	-	
Jumlah		44,230,815	100.00	90.4553	92.19	93.93	95.67	97.41	98.27	99.14	100.00	100.00	100.00	

Palangka Raya, 06 September 2017

Dibuat Oleh :
 CV. CAKRAWALA KATULISTIWA
 Palangka Raya


ANDREI PRADATA, S.Hut
 Direktur
